

Lyon, le 9 mars 2026

## **COMMUNIQUÉ DE PRESSE**

### **Terrasses Presqu'île : point d'avancement**

**Les travaux de confortement du mur de rive historique des Terrasses Presqu'île vont pouvoir être finalisés prochainement, après la période des crues. L'aménagement de la partie basse, au plus près du fleuve, prendra le relais pour une livraison prévisionnelle à l'été 2026.**




Suite à un affaissement localisé du mur de rive sur environ 50 mètres au nord du pont Maréchal Juin, début 2024, le chantier des Terrasses Presqu'île conduit par la Métropole de Lyon a été interrompu pour des raisons de sécurité. A la suite d'investigations, des travaux de confortement ont été lancés par la Métropole de Lyon et confiés à l'entreprise Maïa Fondations.

#### **Une opération délicate pour conforter le mur de rive historique**

Débutés en septembre 2025, ces travaux ont consisté à mettre en place dans le mur de rive affaissé une vingtaine de micropieux verticaux de plus de 11,5 mètres de long et des tirants inclinés de 14,5 mètres de long. Les travaux de forage de micropieux et de tirants ont été réalisés depuis la voie fluviale (foreuse et matériel sur barge), en accord avec Voies Navigables de France. Fin février 2026, tous les micropieux et tirants ont été réalisés. Une longrine en béton armé sera coulée en tête de mur sur laquelle reposera la pierre de rive en calcaire, dans la continuité historique des quais de Saône : ce sera la dernière étape des travaux de confortement.

#### **Contacts presse :**

Laetitia Latapy, attachée de presse – email : [llatapy@grandlyon.com](mailto:llatapy@grandlyon.com) – tel. 06 46 18 90 93

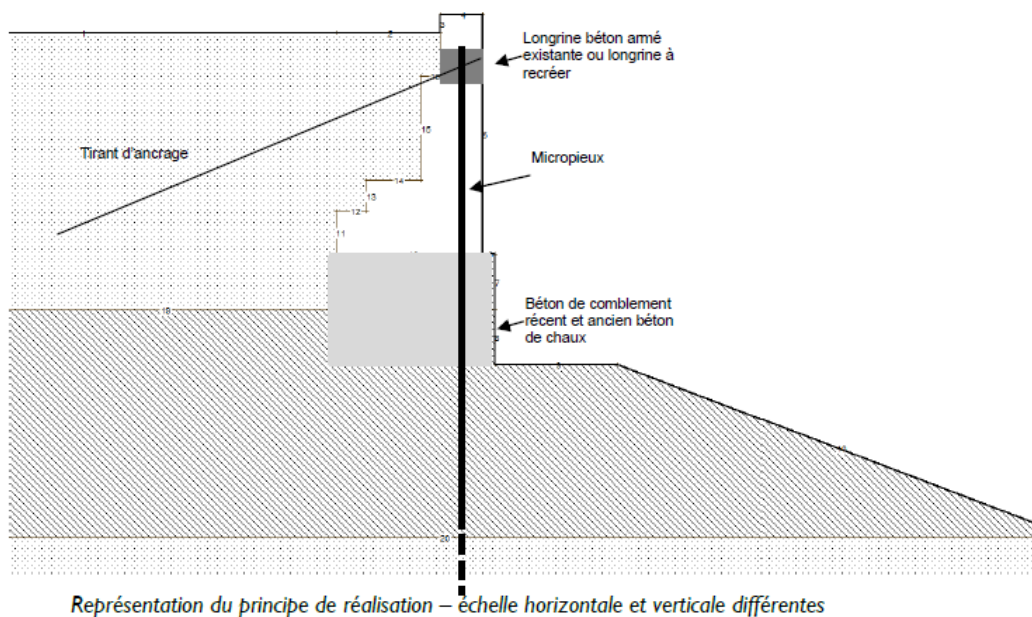

### **Les prochaines étapes en vue d'une livraison à l'été 2026**

Le chantier de confortement a dû faire face à plusieurs périodes de crues importantes entre novembre 2025 et fin février 2026.

La dernière crue étant terminée, le chantier de confortement reprend pour encore quelques semaines. Les travaux d'aménagement le bas port prendront la suite, portant la fin prévisionnelle des aménagements à l'été 2026.

Un jardin fluvial sera alors livré sur cette section et la continuité piétonne sera retrouvée. Les végétaux seront plantés à l'hiver 2026, période favorable pour un meilleur enracinement.

### **Contact presse**

Laetitia Latapy, attachée de presse – email : [llatapy@grandlyon.com](mailto:llatapy@grandlyon.com) – tel. 06 46 18 90 93
